СЕТЕВОЙ ГРАФИК · НОВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЁТ

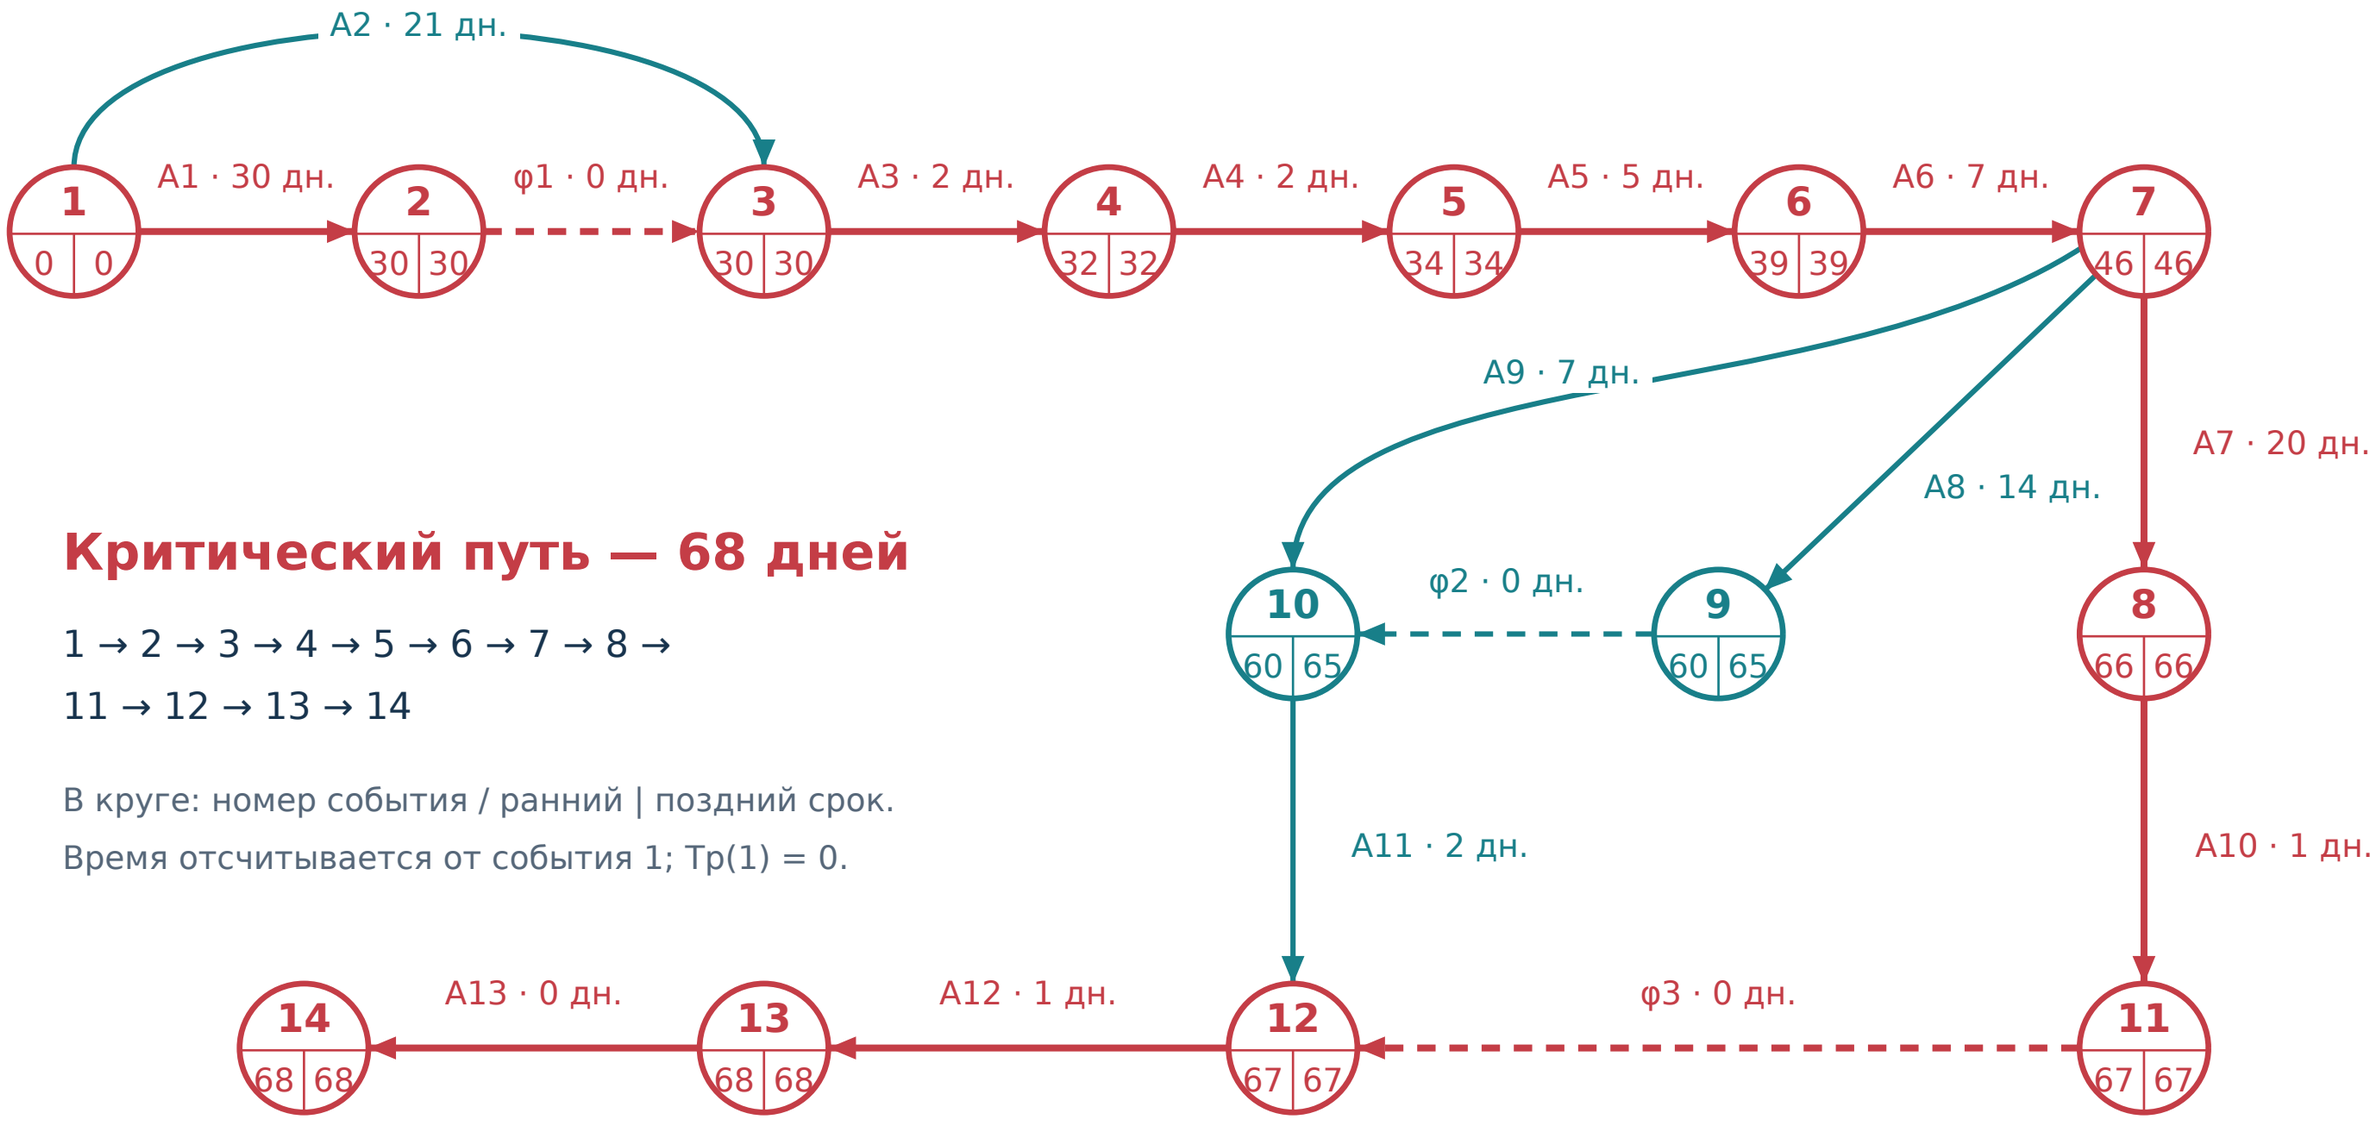

Критический путь — 68 дней

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 →
11 → 12 → 13 → 14

В круге: номер события / ранний | поздний срок.

Время отсчитывается от события 1; Tp(1) = 0.

Критические работы и связи

Фиктивные связи φ1–φ3: 0 дней

A1–A13 — работы из исходной таблицы; красный цвет означает нулевой полный резерв.
